

中園廃棄物最終処分場

令和6年 4 月 埋 立 地 内 施 設 点 検 表（チェックシート）

施設		点検項目	点検結果	点検日	特記事項
貯留構造物	重力式コンクリート	盛土との接合部のクラック、剥離、劣化	☒ 問題なし ☐ 問題有り	4月25日	
		天端管理用道路の陥没	☒ 問題なし ☐ 問題有り	4月25日	
		下流側コンクリート面のクラック、漏水	☒ 問題なし ☐ 問題有り	4月25日	
		重力式コンクリート天端の高さ	別紙記載	4月25日	
		堰堤の位置	別紙記載	4月25日	
雨水集排水施設	雨水・外周排水路	施設の損傷及び不当沈下の有無	☒ 問題なし ☐ 問題有り	4月25日	
		U字溝、減勢工、集水枡、接続枡、呑口工などの土砂の堆積状況	☒ 問題なし ☐ 問題有り	4月25日	
		溢流箇所や滞水箇所の有無及び状況	☒ 問題なし ☐ 問題有り	4月25日	
		周辺部からの水及び土砂の流入状況	☒ 問題なし ☐ 問題有り	4月25日	
		周辺部の雑草の生育状況	☒ 問題なし ☐ 問題有り	4月25日	
		雨水の流下状況	☒ 問題なし ☐ 問題有り	4月25日	
道路設備	搬入道路部	舗装面の破損の有無	☒ 問題なし ☐ 問題有り	4月25日	
		倒木・土砂流入による交通傷害	☒ 問題なし ☐ 問題有り	4月25日	
		搬入車両からの落下物	☒ 問題なし ☐ 問題有り	4月25日	
		搬入車両による道路の汚染	☒ 問題なし ☐ 問題有り	4月25日	
埋立地平面部		現地盤の陥没、沈下による滞水の状況	☒ 問題なし ☐ 問題有り	4月25日	
埋処理ガス施設	露出箇所	ガス抜き設備の不具合	☒ 問題なし ☐ 問題有り	4月25日	

(備考)

.....

.....

.....


.....

点検者 石 動 絢 暉

中園廃棄物最終処分場
重力式コンクリート測定

令和 6年 4月

H17-T29
H=126.674

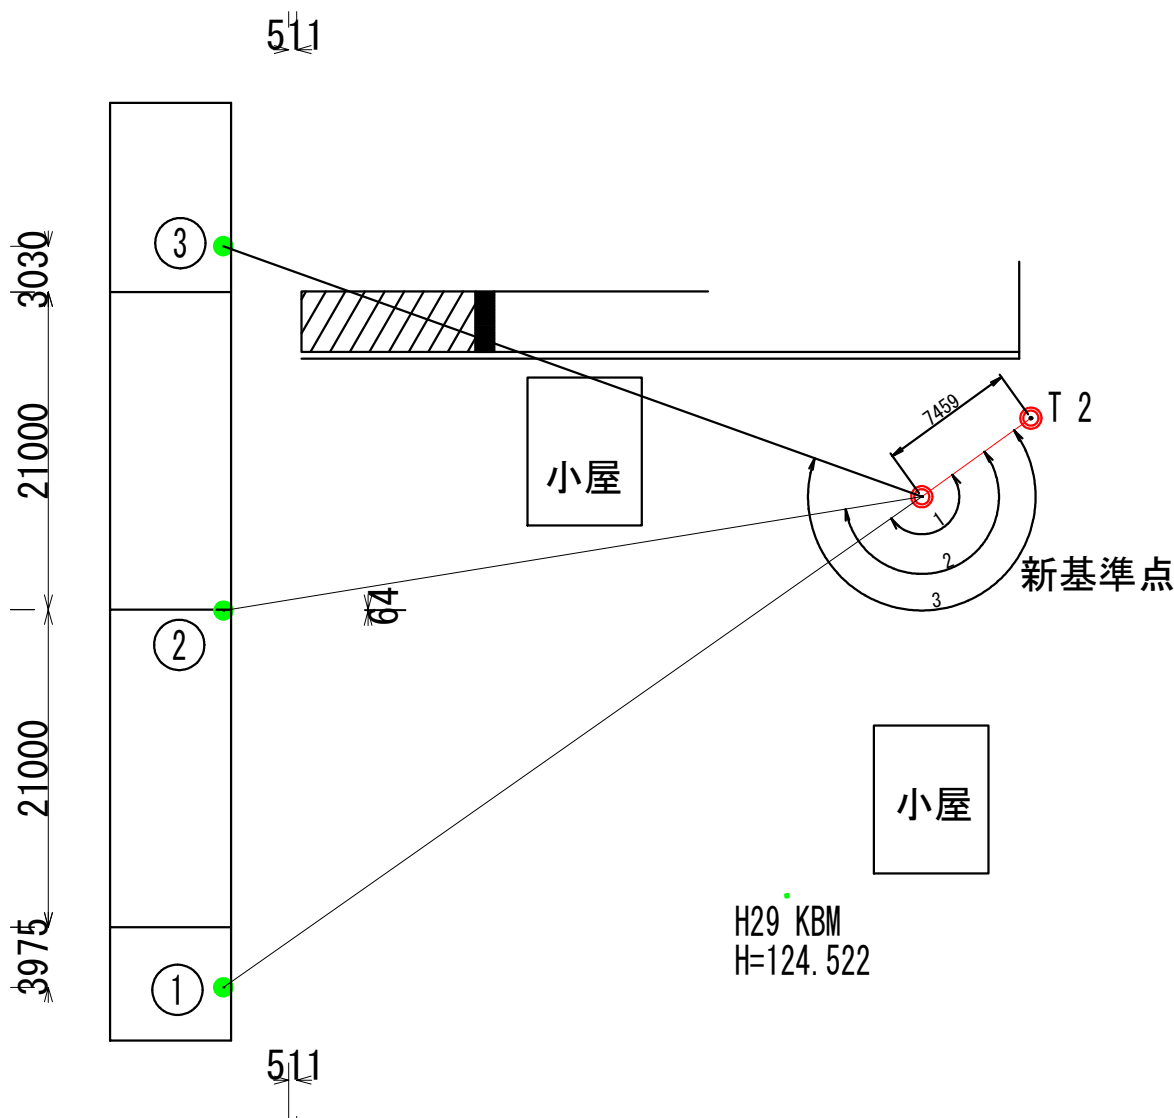

	①		②		③		備考
月日	基準高	角度	基準高	角度	基準高	角度	
12月	129.227	202° 15' 10"	129.236	226° 59' 30"	129.229	252° 18' 20"	
4月	129.229	202° 15' 10"	129.237	226° 59' 30"	129.231	252° 18' 30"	
5月							
6月							
7月							
8月							
9月							
10月							
11月							
12月							
1月							積雪の為、測定不可
2月							積雪の為、測定不可
3月							積雪の為、測定不可
