様式－7

旭川市廃棄物処分場

R3．8月　埋立地内施設点検表（チェックシート）

施設		点検項目	点検結果	点検日	特記事項
貯留構造物	重力式コンクリート	盛土との接合部のクラック、剥離、劣化	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月20日	
		天端管理用道路の陥没	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月20日	
		下流側コンクリート面のクラック、漏水	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月20日	
		重力式コンクリート天端の高さ	別紙記載	8月20日	
		堰堤の位置	別紙記載	8月20日	
遮水シート	保護マットで覆われている状態	異常なへこみ	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		膨らみ、へこみ、突っ張り(トランポリン状態)	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		保護マットの剥がれ	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		降水後の湛水状況	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		湧水・ガス噴出	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		接合部の剥がれ、口あき	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		草の生育	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
	保護土で覆われている状態	表面の亀裂、陥没	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		湧水・ガス噴出	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		押し出し(浮き上がり)	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		滑落、崩壊	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		ガス噴出	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		降水後の湛水状況	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
雨水集排水施設	雨水集排水路・谷止工	施設の損傷および不等沈下の有無	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		U字溝、減勢工、集水桝、接続桝、呑口工などの土砂の堆積状況	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		溢流箇所や滞水箇所の有無およびその状況	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		周辺部からの水および土砂の流入状況	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		周辺部の雑草の生育状況	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		雨水の流下状況	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
	雨水調整池	上流呑口工と吐口工の状況	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		下流呑口工と吐口工の状況	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		上流呑口工と吐口工の接続管（φ1200）	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		下流呑口工と吐口工の接続管（φ1200）	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		貯留している水位	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		池底の土砂などの堆積状況	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		斜面の土砂などの堆積状況	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		斜面の雑草の生育状況	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		堰堤の破損、陥没	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		法面の崩壊	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		放流工および放水管への土砂の堆積状況	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		放流工および放水管の損傷の有無	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	
		下流放流工のスクリーン	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月17日	

（備　考）

様式－7

No.2

旭川市廃棄物処分場

埋立地内施設点検表（チェックシート）

施設		点検項目	点検結果	点検日	特記事項
浸出水集排水施設	集排水管	埋立地表面の亀裂、陥没	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月20日	
	導水管	道路面の亀裂、陥没	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月20日	
埋立ガス処理施設	露出箇所	埋立作業周辺のガス抜き設備	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月24日	
		埋立作業箇所から離れた設備	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月24日	
道路設備		舗装面の破損の有無	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月24日	
		倒木・土砂流入による交通阻害	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月24日	
		積雪による交通阻害	☐ 問題なし ☐ 問題あり		
		廃棄物搬入車両からの落下物	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月24日	
飛散防止設備	飛散防止柵	飛散防止柵の傾き	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月13日	
		防球ネットの破れ、ほつれ	☐ 問題なし ☑ 問題あり	8月13日	補修完了
		支柱基礎部分の洗掘	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月13日	
		支柱の安定性	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月13日	
		防球ネットのゆるみ	☐ 問題なし ☑ 問題あり	8月13日	補修完了
		ワイヤーロープのゆるみ	☐ 問題なし ☑ 問題あり	8月13日	補修完了
防火設備	上流側防火水槽	水槽の水位（漏水の有無）	☐ 問題なし ☐ 問題あり	8月16日	
		地下水からの取水状況	☐ 問題なし ☐ 問題あり	8月16日	
		給水管、オーバーフロー管の目詰まり	☐ 問題なし ☐ 問題あり	8月16日	
		通気管の目詰まり	☐ 問題なし ☐ 問題あり	8月16日	
		給水栓への送水状況	☐ 問題なし ☐ 問題あり	8月16日	
		送水ポンプの作動	☐ 問題なし ☐ 問題あり	8月16日	
	下流側防火水槽	水槽の水位（漏水の有無）	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月16日	
		地下水からの取水状況	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月16日	
		給水管、オーバーフロー管の目詰まり	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月16日	
		通気管の目詰まり	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月16日	
		給水栓への送水状況	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月16日	
		送水ポンプの作動	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月16日	
	消火栓	防火水槽からの配管の目詰まり	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月16日	
		水の吐出状況	☑ 問題なし ☐ 問題あり	8月16日	

（備　考）

点　検　者　　山　崎　敦　樹

重力式コンクリート測定結果表

	②ブロック		④ブロック		⑥ブロック		⑧ブロック		⑩ブロック		⑫ブロック		⑭ブロック	
設計値(堰堤天端背面)	186.000	―	186.000	―	186.000	―	186.000	―	186.000	―	186.000	―	186.000	―
令和 2年 11月 16日測定	185.997	-3	186.001	1	185.998	-2	186.001	1	185.997	-3	185.999	-1	185.998	-2
令和3年04月23日測定	185.998	-2	186.001	1	185.998	-2	186.000	0	185.997	-3	185.999	-1	185.998	-2
令和3年05月19日測定	185.999	-1	186.001	1	185.997	-3	186.002	2	185.998	-2	185.998	-2	185.999	-1
令和3年06月21日測定	185.999	-1	186.001	1	185.997	-3	186.002	2	185.998	-2	185.998	-2	185.999	-1
令和3年07月24日測定	185.998	-2	186.000	0	185.997	-3	186.001	1	185.999	-1	185.999	-1	185.999	-1
令和3年08月20日測定	185.998	-2	185.999	-1	185.998	-2	186.000	0	185.999	-1	185.999	-1	186.000	0

	距　離	
設計値 (堰堤天端背面～吸水人孔)	49.000	
令和 2年 11月 16日測定	48.992	-8
令和3年04月23日測定	48.990	-10
令和3年05月19日測定	48.991	-9
令和3年06月21日測定	48.991	-9
令和3年07月24日測定	48.993	-7
令和3年08月20日測定	48.994	-6
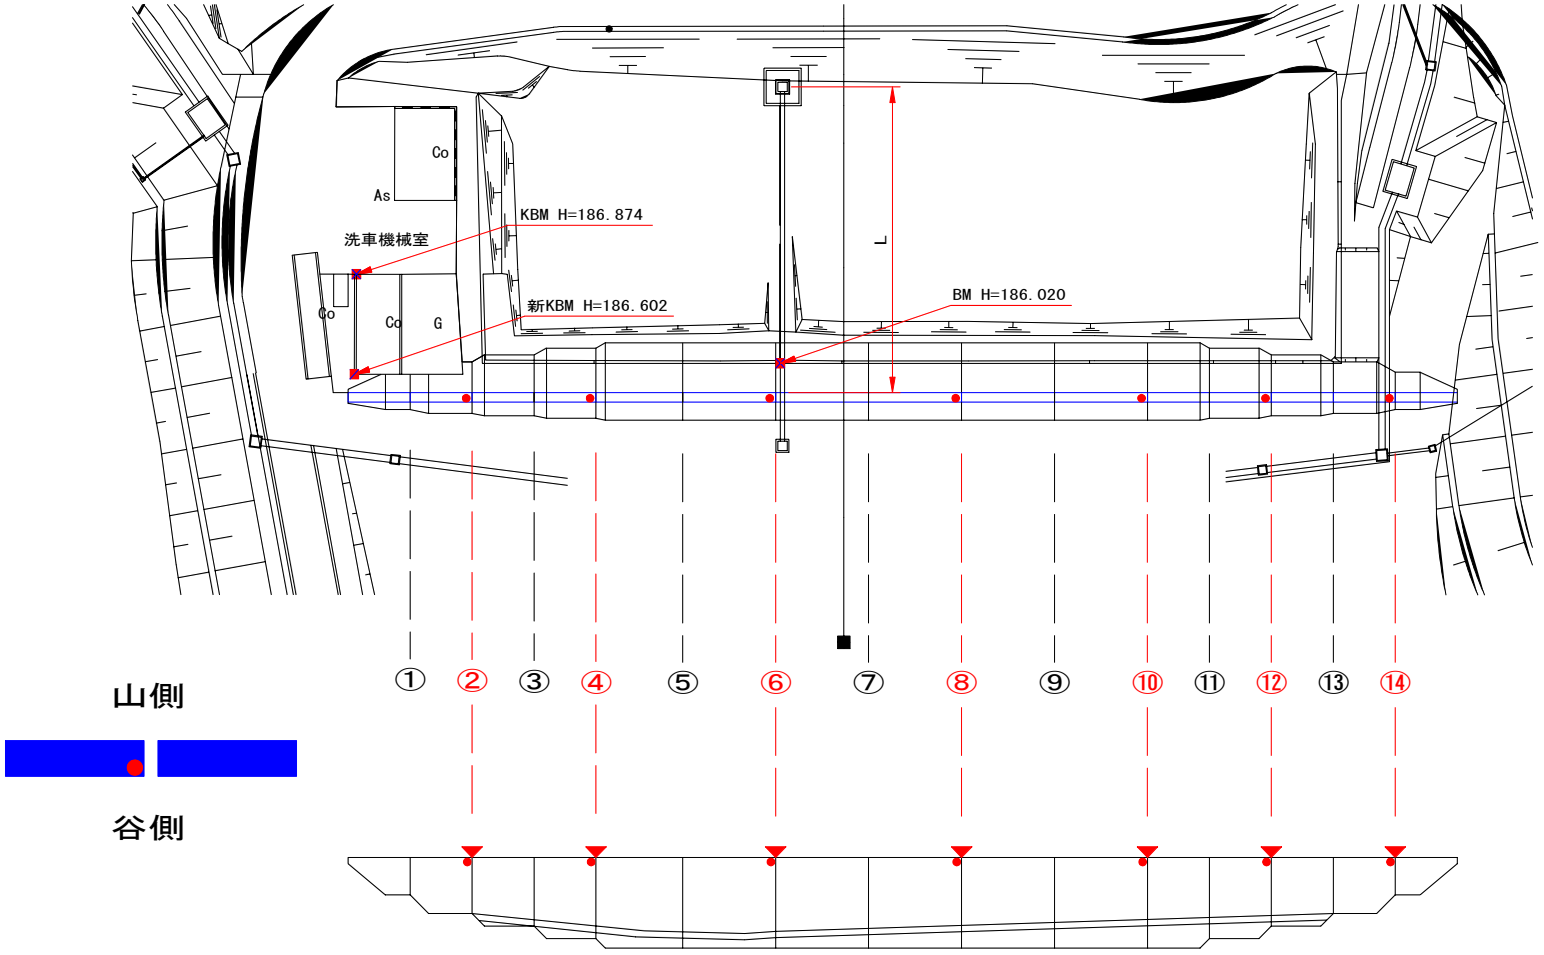
重力式コンクリート　天端高さ測定箇所図
